


PLAN OPERATIVO - 2015



ACTIVIDAD:
"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD – PROVINCIA DE PADRE ABAD – REGIÓN UCAYALI)" - 2015

EJECUTOR:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

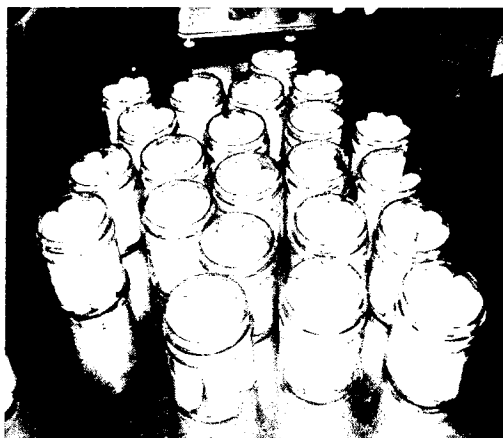

AGUAYTIA, FEBRERO 2015



INDICE

000002

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Nombre de la Actividad
- 1.2. Objetivo de la Actividad
- 1.3. Monto Total de la inversión
- 1.4. Ámbito de intervención
- 1.5. N° de Familias Beneficiarias
- 1.6. Plazo de Ejecución
- 1.7. Financiamiento

II DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

- 1.- Fase de Selección del Equipo Técnico
 - 1.1 Selección, evaluación y contratación del Equipo Técnico.
- 2.- Fase de Formación de facilitadores.
 - 2.1 Selección de Institución Capacitadora en Metodología CEFE.
 - 2.2 Capacitación de Extensionistas.
- 3.- Fase de Planificación y Organización
 - 3.1 Identificación de la Comunidad y Participantes
 - 3.2 Inducción y Socialización de la Actividad.
 - 3.3 Implementación y Definición de Curricula.
- 4.- Fase de Ejecución
 - 4.1 Sinceramiento del Grupo (Participantes).
 - 4.2 Determinación del Contenido de las Sesione de ECA's.
 - 4.3 Establecimiento de las Parcelas de Aprendizaje.
 - 4.3.1 Parcelas de Aprendizaje de Pijuayo para Palmito.
 - 4.3.2 Parcelas de Aprendizaje de Piña.



000008

4.4 Desarrollo de las Sesiones de ECA.

4.4.1 Desarrollo de las Escuelas de Campo.

4.4.2 Festivales (Ferias)

4.4.3 Asistencia Técnica (Visitas de Campo).

4.4.4 Plan de Negocios.

4.4.5 Fortalecimiento Organizacional

4.4.6 Reuniones de Comercialización.

4.5 Graduación.

4.5.1 Prueba de Caja.

4.5.2 Entrega de Certificados.

4.6 Supervisión.

4.6.1 Informes de Supervisión.

4.6.2 Reuniones Descentralizadas del Equipo Técnico.

4.7 Elaboración de Material Didáctico.

4.7.1 Diseño y Elaboración de Boletines Técnicos.

4.7.2 Diseño y Elaboración de Trípticos.

5. Fase de Comunicación y Visibilidad.

5.1 Difusión mediante publicidad y notas de prensa.

5.2 Banners.



000004

III PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- 3.1. Formato N° 1: Programación de Metas Físicas de la Actividad
- 3.2. Formato N° 2: Programación de Metas Financieras de la Actividad

IV ANEXO

- Mapa de Ubicación



I. DATOS GENERALES

000005

1.1. Nombre de la Actividad:

"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI)" - 2015.

1.2. Objetivo de la Actividad:

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de la capacidad productiva del Pijuayo para palmito y de Piña como alternativa lícita del ámbito del Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledaños.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fortalecer capacidades técnicas de productores de piña y pijuayo para palmito, en la zona de influencia del Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledaños, utilizando metodologías de aprendizaje participativo y simuladores empresariales.

Mejorar los niveles de producción, productividad y calidad de los cultivos de Piña ("Golden" y "Cayena Lisa") y Pijuayo para Palmito de los agricultores del C.P.M. de Huipoca y Aledaños, para incrementar sus ingresos económicos.

Fortalecer la capacidad administrativa, productiva y comercial de las organizaciones: Asociación de Productores de Palmito de Aguaytía (ASPPA) y Asociación de Piñeros Industriales de Padre Abad (APIPPA).

1.3. Monto total de la Inversión:

El monto de la inversión es de **S/. 800,000.00** Nuevos Soles.

1.4. Ámbito de intervención:

CUADRO No. 01: ZONAS PRIORIZADAS

Departamento	Provincia	Distrito	Comunidades		
UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	La Curva	Barrio Unido	Miraflores
			La Punta	Cedruyo	Libertad/Ericka
			Huacamayo	Rio Negro	Alto Shambillo
			Huacamaillo	San Pedro	Bajo Shambillo
			Porvenir	Pampa Yurac	Mediación
			Nuevo Jordán	Mariela	Paujil/Shambo
			San Antonio	Miraflores	Rio Blanco
			Llanta Blanca		Rio Negro
			Aguas Verdes		Selva Turística
			Diana/Chio		



000006

1.5. Número de Beneficiarios:

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

92 Agricultores dedicados al cultivo de Piña y 46 Agricultores dedicados al cultivo de Pijuayo para Palmito, cultivos que se desarrollan satisfactoriamente en el C.P.M. de Huipoca y Aledaños, participaran en las 4 ECA's y recibirán asistencia técnica (ver cuadro siguiente).

Por lo tanto, en la Actividad del presente año participarán un **total 138 Agricultores**, en base a la relación sincerada del 2014.

Item	Comunidades	Beneficiarios/Productores		
		Palmito	Piña	Total
1	La Curva / La Punta		1	1
2	Huacamayo		18	18
3	Huacamaillo		4	4
4	Porvenir		35	35
5	Cerro Colorado		5	5
6	Nuevo Jordán	14	2	16
7	San Antonio	6		6
8	Llanta Blanca			0
9	Agua Verdes	1	1	2
10	Localidades Aledañas	9	24	33
11	Localidades de Shambillo	16	2	18
	TOTAL	46	92	138

1.6. Plazo de Ejecución:

10 meses (Marzo a Diciembre 2015)

1.7. Financiamiento:

DEVIDA: S/. 800,000.00 Nuevos Soles



II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

00000

La presente Actividad es para reforzar y garantizar la sostenibilidad del desarrollo de capacidades realizada durante el año 2014; es decir, se reforzará los conocimientos tecnológicos más importantes (planes de abonamiento, control fitosanitario, cosecha y post cosecha, valor agregado) y fortalecer la asociatividad y gestión comercial. Se va a promover la capacitación en temas ambientales, manejo de suelos y buenas prácticas agrícolas debido a que el ámbito de intervención tiene suelos con pendiente y degradados, a los cuales mediante la presente Actividad estamos dando uso productivo debido a que ambos cultivos (palmito y piña) prosperan bien a diferencia de otros cultivos.

En el cultivo de pijuayo para palmito se continuará asesorando las plantaciones en crecimiento y producción, mientras que en el cultivo de piña la tarea más importante es continuar manejando las nuevas plantaciones de piña variedad "Golden" producidos en los semilleros durante el 2013 - 2014. Esta variedad de piña es relativamente nueva para los piñeros de la zona y requieren seguir teniendo asistencia técnica, capacitación y manejando parcelas demostrativas para garantizar la producción comercial de calidad y sobre todo lograr comercializar a los mejores precios.

Los cultivos de la Actividad son altamente intensivos debido a que se siembra 7,500 plantas/ha en pijuayo para palmito y 35,500 plantas/ha en piña, además las producción es constante durante todo el año, por ello se requiere tener un equipo técnico importante.

Se propone 2 facilitadores de piña más el apoyo de 2 técnicos para asistir el manejo de 20 ha de piña Golden más 20 ha de piña Cayena Lisa; mientras que en pijuayo para palmito se tendrá solo 1 facilitador más el apoyo de un técnico para las labores de manejo de 80 ha de parcelas comerciales. Por tanto, se tendrá 3 ECAs, (2 en piña, 1 en palmito y cada ECA realizará 12 sesiones/año), en el mes de Mayo deberá iniciarse las sesiones y se realizarán 2 sesiones por mes por cada ECA, que se desarrollarán generalmente cada fin de semana. Los mismos extensionistas/facilitadores realizarán las visitas de asistencia técnica con el apoyo de los técnicos de campo.



La actividad comprende 5 fases:

000000

- ✓ Fase N° 01.- Selección del Equipo Técnico.
- ✓ Fase N° 02.- Formación de Facilitadores.
- ✓ Fase N° 03.- Planificación y Organización.
- ✓ Fase N° 04.- Ejecución.
- ✓ Fase N° 05.- Comunicación y Visibilidad.

1. FASE: SELECCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO:

En esta etapa se seleccionará al personal profesional de la Actividad y se contratará a 1 coordinador, 3 facilitadores, 3 técnicos de campo, 1 especialista en valor agregado y 1 asistente administrativo.

1.1. Selección del Equipo Técnico de la Actividad.

Para la selección y evaluación del personal profesional y técnico se considerará principalmente lo siguiente:

El Coordinador de la Actividad debe ser un Ing. Agrónomo o M.Sc. especialista y con experiencia en el cultivo de pijuayo para palmito y piña; con amplia experiencia en el manejo de proyectos similares, en ECA's y CEFE; es el encargado de diseñar, planificar y ejecutar las actividades del Plan Operativo. Responde ante la institución ejecutora y la institución financiera.

Los facilitadores (extensionistas) deben ser agrónomos con amplio conocimiento en el cultivo y dominio de metodologías participativas para los procesos de capacitación mediante ECA's y CEFE y deben estar convencidos de la metodología empleada. Serán los responsables de fomentar e implementar la creación y operatividad de las 3 ECA's y de la asistencia técnica. De manera permanente informarán a la coordinación, las actividades ejecutadas y los avances de acuerdo a los formatos y fechas establecidas.

El especialista en valor agregado debe ser ingeniero, bachiller o especializado en el tema y contar con experiencia comprobada en procesamiento de conservas de palmito y piña, conocimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el Programa de Higiene y Saneamiento (PHS).



Los técnicos de campo deben ser bachilleres o técnicos agrarios de la zona que se incorporaran para ir formando profesionales especializados en los cultivos de palmito y piña, deben tener conocimiento del ámbito de la actividad, ser proactivos, y su desempeño será apoyando las labores de campo que se desarrollaran durante el presente año.

El especialista administrativo debe tener estudios superiores en administración, contabilidad, computación o similar, experiencia en proyectos similares en instituciones públicas.

En todos los casos la experiencia profesional debe ser debidamente acreditada (evidencias). Adicionalmente el personal requerido debe tener el siguiente perfil: Debe ser comunicativo, tener conocimiento básico sobre extensión agropecuaria, tener conocimiento sobre el territorio de intervención de la actividad, tener conocimiento básico sobre metodología ECA's, CEFE, aptitudes de liderazgo, conocimiento de desarrollo rural, entre otros.

CARGO	CANTIDAD
Coordinador de la Actividad	1
Facilitadores (extensionistas)	3
Especialista en Valor Agregado	1
Técnicos de Campo	3
Asistente administrativo	1
TOTAL PERSONAL	9

Unidad de medida: Informe

Meta: 01

2. FASE: FORMACIÓN DE FACILITADORES:

En esta fase se reforzará los conocimientos del personal en la metodología de ECA's mediante simuladores empresariales CEFE, así como reforzar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y Plan de Manejo Ambiental, lo cual será replicado por los extensionistas hacia los productores.

2.1. Selección de Institución Capacitadora en metodología CEFE.

El éxito de la presente Actividad se basa en la eficiencia que se tiene que lograr utilizando la herramienta de capacitación Escuelas de Campo para Agricultores (ECA's) y la Asistencia Técnica personalizada, por ello en la presente etapa del proceso de desarrollo de capacidades de los productores es necesario reforzar los conocimientos de los facilitadores en la metodología de capacitación con simuladores empresariales conocida como metodología CEFE.



Esta metodología sencilla, vivencial y formativa permite fortalecer los conocimientos sobre el individuo, la organización y el mercado; y por ello se propone desarrollar estos conocimientos, toda vez que en esta etapa los conocimientos técnicos productivos y de calidad se han avanzado y hay que fortalecer los aspectos de organización y mercado de los productos que se vienen promoviendo.

Dicha capacitación estará a cargo de una institución público-privada con experiencia para el adiestramiento sobre manejo, uso y aplicación de la metodología de capacitación CEFE, la duración será de 2 días y 8 horas diaria. La Municipalidad de Padre Abad para evaluar y seleccionar a la institución o consultor que va a brindar este servicio, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Experiencia debidamente comprobada.
- Estar realizando trabajos de capacitación y extensión agrícola mediante la metodología de CEFE y ECA's.

Unidad de medida: Informe

Meta: 01

2.2. Capacitación de Extensionistas.

ADIESTRAMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Se reforzará al personal y productores líderes en el conocimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con énfasis en prácticas de higiene en frutas, acondicionamiento, empaque, almacenamiento y transporte de frutas y productos procesados, inocuidad alimentaria y seguridad de las personas.

ADIESTRAMIENTO EN MANEJO AMBIENTAL

Se capacitará al personal y productores líderes participantes en la Actividad, en temas como: Plan de Manejo Ambiental, Cuidado del Medio Ambiente, Clasificación y Selección de Residuos Sólidos, Estudio de Impacto Ambiental, Manejo de Laderas, Sistemas de siembra, etc.

En ambos temas especializados se van a reforzar los temas que no se han desarrollado en el 2014, porque tanto las BPA como PMA contienen una amplia gama de temas. Se contratará especialistas en estos temas que se desarrollaran en 2 días de 8 horas/día.

Unidad de medida: Informe

Meta: 02



3. FASE: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN:

Los participantes son los productores de pijuayo para palmito y los productores de piña cuyas plantaciones se encuentran en el ámbito del Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledaños; quienes actualmente tienen plantaciones de palmito y piña en diferentes estados de manejo y producción, los productores participarán activamente en las Escuelas de Campo, asistencia técnica y en el manejo de sus parcelas y en la organización del cual son asociados. Además luego de las primeras reuniones se coordinará la participación de otros productores que no se presentan en la relación inicial y están manifestando su interés en recibir capacitación y asistencia técnica.

3.1. Identificación de la Comunidad y Participantes.

Para el caso de la presente Actividad, las comunidades ya se encuentran identificadas y son todas aquellas en que actualmente se tienen productores de los cultivos de pijuayo para palmito y piña; es decir, tenemos un total de 11 comunidades (9 comunidades del C.P.M. Huipoca y 2 zonas de caseríos aledaños).

Mientras que para la identificación de los productores participantes en la Actividad, los criterios para la selección de los participantes son:

- Que cuenten con plantaciones de Pijuayo para Palmito y/o Piña en instalación y/o producción
- Las parcelas deben ser de propiedad del productor
- Las parcelas deben ser conducidas por el mismo productor y sus familiares
- Que estén manejando adecuadamente y cosechando en forma organizada.
- Que estén asociados o estén en proceso de asociarse en sus respectivas organizaciones de productores.
- Necesidad de resolver algún problema en el desarrollo del cultivo y/o post cosecha o de alguna parte de la cadena productiva
- Que tengan voluntad de capacitarse
- Que participen activamente en las sesiones a programar y en las reuniones
- Deben ser proactivos, emprendedores y tener aptitud de liderazgo



La identificación de los participantes se logrará utilizando los criterios mencionados y la recopilación de información de productores de piña y palmito de la Agencia Agraria Padre Abad y la Municipalidad Provincial de Padre Abad, cuya relación de productores de palmito y piña nos servirán de base para las reuniones de inducción y sensibilización que se llevará a cabo.

Unidad de medida: Informe

Meta: 01

3.2. Inducción y Socialización de la Actividad.

Con la participación de los extensionistas y el coordinador se realizarán las reuniones de coordinación e información a los productores de palmito y de piña del Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledaños, así mismo se realizará reuniones con las organizaciones de productores que los agrupan e igualmente con las autoridades locales del ámbito en que se ejecuta la Actividad.

Las reuniones de sensibilización, información y coordinación se realizarán con la finalidad de establecer lazos de confianza entre los agricultores que deseen participar en la implementación de las Escuelas de Campo, Asistencia Técnica y Parcela de Aprendizaje y en base a ello definir conjuntamente con ellos las actividades necesarias para asegurar el éxito de la Actividad (Cronograma de Actividades/mes/año) teniendo en cuenta el ciclo del cultivo y/o el calendario agrícola de la zona.

En esta fase se debe realizarse reuniones de información y coordinación en por lo menos 4 localidades en donde se pueda congregar a los productores de palmito y piña interesados en participar en la presente Actividad. Este proceso se desarrollará convocando a las reuniones mediante la utilización de medios de comunicación y difusión, visitas personalizadas a los productores y el apoyo de las autoridades locales. La idea es articular el trabajo de los facilitadores con los productores en el ámbito a intervenir teniendo en cuenta el contexto social que se pueda tener en esos momentos, aprovechando las potencialidades y corrigiendo las limitaciones existentes, incorporando sistemáticamente estrategias y acciones tendientes a crear condiciones de equidad, respeto intercultural e igualdad entre hombres y mujeres en las zonas de influencia cocalera. Durante las reuniones se han firmar la lista de asistentes y actas personales de participación de los productores.



También se realizará la presentación oficial del inicio de acciones de la presente Actividad, ante los productores, autoridades y público en general. Se realizará en conjunto con los demás proyectos y actividades que ejecuta la MPPA el 2015.

Unidad de medida: Informes / Actas

Meta: 04

3.3. Implementación y Definición de Curricula.

Primeramente con el equipo técnico se analizará la realidad en que se va a intervenir, utilizando los documentos de diagnóstico y línea base que se tiene de la Actividad realizada en el 2014. A partir de ello, se propondrá los lineamientos y estrategias para la implementación y definición de la curricula para el 2015.

Se analizará el contexto en que se encuentran los conocimientos de los productores, el estado de las plantaciones, prácticas culturales que realizan, mano de obra utilizada, fortalezas, limitantes, ingresos obtenidos, tenencia de la tierra, desarrollo organizacional, etc. Con la finalidad de definir qué temas se deben desarrollar el presente año, considerando que estamos en un proceso de aprendizaje paulatino.

A partir de ello, se va a elaborar un informe en donde se propone las reglas de juego, reglamentos y operaciones a desarrollarse durante la ejecución de la presente Actividad, así como la propuesta de la curricula a ejecutar. Este documento debe socializarse a los productores que han decidido participar voluntariamente en la Actividad.

Unidad de medida: Informe

Meta: 01



4. FASE: EJECUCIÓN:

En la presente fase el equipo técnico, iniciará las acciones en el campo en coordinación con las autoridades, líderes, directivos de las organizaciones de productores y agricultores (personas capacitadas), para dar inicio el trabajo de Escuelas de Campo, la Asistencia Técnica y las Parcelas de Aprendizaje a través de las diferentes estrategias planteadas en el presente documento.

4.1. Sinceramiento del Grupo (Participantes)

El padrón inicial es la base inicial, lo cual puede modificarse y además cada año es necesario hacer firmar los compromisos; por ello, el equipo técnico, durante las reuniones informativas y de coordinación con las autoridades comunales y los directivos de las organizaciones de productores que los agrupan, además de evaluar la participación de los productores, se procederá a hacer firmar un padrón de productores que por voluntad propia suman el compromiso de participar en la Actividad, de manera que se tendrá la relación de los agricultores (personas capacitadas) productores de pijuayo para palmito y piña, que participaran en la implementación de la Actividad.

Beneficiarios o Participantes.

La primera relación estará conformada por todos aquellos productores de palmito y piña que voluntariamente deseen participar. Posteriormente antes del inicio de las sesiones de ECA's, se tendrá la relación definitiva de productores que participarán en las ECA's y la asistencia técnica.

Unidad de medida: Informe.

Meta: 01

4.2. Determinación del Contenido de las Sesiones de ECA's.

El contenido técnico será determinado por los agricultores (personas capacitadas) participantes de la Actividad, en donde los extensionistas serán facilitadores orientándolos en la identificación y priorización de los temas que necesitan desarrollar durante el presente año.

Los temas de la curricula que se desarrollarán en las sesiones de las Escuelas de Campo se definirán con los mismos productores participantes en conjunto con sus facilitadores, sin embargo consideramos que para esta etapa del plan de asistencia a los productores de palmito y piña, los temas serán el reforzamiento de las sesiones técnicas más importantes para lograr mayor productividad, rendimiento y calidad, así como desarrollar temas de asociatividad, transformación y comercialización.

A continuación la Propuesta de la sesiones de las ECA's .

- Reforzamiento de la metodología de ECA's – Pruebas de Caja
- Abonamiento de las plantaciones
- Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
- Cosecha y Post Cosecha
- Generación de Valor Agregado Artesanal
- Buenas Prácticas Agrícolas
- Siembras a Curvas de Nivel



- Sensibilización en el Cuidado del Medio Ambiente
- Manejo de Residuos Sólidos
- Costos de Producción y Registros
- Elaboración de Planes de Trabajo
- Gestión Dirigencial

Unidad de medida: Informe.

Meta: 01


4.3. Establecimiento de las Parcelas de Aprendizaje.

Para aplicar los conocimientos desarrollados en las sesiones de las Escuelas de Campo se debe identificar y seleccionar parcelas de aprendizaje en las cuales se van a desarrollar las diferentes prácticas culturales que se realiza en el cultivo de Pijuayo para palmito y en el cultivo de Piña Golden y Cayena Lisa, en dichas parcelas se ejecutarán todas las prácticas culturales necesarias para lograr incrementar la producción, rendimiento y calidad de las cosechas.

Para la selección de estas parcelas de aprendizaje se debe considerar lo siguiente:

- La parcela debe pertenecer a un productor de palmito y/o piña activo.
- Deben estar ubicadas cerca a la Escuela (Aula) de Campo.
- Deben tener fácil accesibilidad (cerca de carretera).
- El productor propietario debe tener una personalidad abierta para el dialogo.
- El propietario debe tener ganas de compartir sus experiencias.
- El propietario debe contar con recursos para cumplir con la realización de las labores culturales.

Las "parcelas de aprendizaje" o "parcelas demostrativas", servirán de base para transferir la tecnología aprendida en las Escuelas de Campo, en estas parcelas se efectuarán todas las actividades que comprende el manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada y oportuna para que los productores observen y repliquen los resultados de estas parcelas, para ello todo el proceso de manejo cultural del cultivo se realizará en forma organizada, mancomunada y participativa.



Se propone apoyar el mantenimiento de 20 parcelas de aprendizaje en el cultivo de pijuayo para palmito debido a que requieren incrementar su oferta comercial para que cumplan sus compromisos de venta; mientras que en el cultivo de piña se propone manejar 20 parcelas de aprendizaje de la variedad Golden; las parcelas ya están identificadas y son aquellas que pertenecen a productores que viene participando activamente en el desarrollo de ambos cultivos, lo cual debe seguir reforzándose durante la presente Actividad.

En el cultivo de pijuayo para palmito, el responsable del cultivo con el apoyo del técnico de campo hará el seguimiento de la ejecución del plan de abonamiento (se aplicará mediados de Mayo y Setiembre, la primera y segunda fracción de abonamiento respectivamente). Las semillas y bolsas serán para ampliar las plantaciones con productores que han solicitado y para ello se firmarán actas de compromiso de participación para garantizar el cumplimiento de las metas en la implementación de las parcelas.

Se continuará instalando las plantaciones comerciales de piña Golden en campos de los productores y durante el presente año 2015 se culminará la siembra de las 20 ha comerciales y se apoyará en el manejo técnico adecuado por parte de los extensionistas y técnicos asignados a este cultivo.

Todas las parcelas demostrativas serán apoyadas por la Actividad con insumos para el abonamiento y algunas herramientas y materiales para ejecutar las prácticas agrícolas. Toda la tecnología estará orientada a lograr producción, rendimiento y calidad de las cosechas y crear condiciones de inserción en mercados exigentes e incluso a mercados internacionales para el caso del palmito, contribuyéndose en el logro de una producción organizada y sostenible que permita mejores ingresos económicos lícitos a las familias participantes.

Unidad de medida: Informe / Parcelas

Meta: 20 de Palmito, 20 de Piña



4.4. Desarrollo de las Sesiones de ECA.

4.4.1 Desarrollo de las Escuelas de Campo

La primera sesión de la Escuela de Campo, es muy importante, pues allí se define el cronograma de las sesiones y la temática curricular de las mismas, en base a las demandas de los agricultores beneficiarios. En esta etapa se deberá evaluar a cada uno de los beneficiarios (prueba de caja/chacra). Además, dentro de la temática curricular deberá considerarse una sesión a fin de abordar el análisis de riesgos elaborando de un mapeo de riesgos (sequias, friajes, inundaciones, deslizamientos, etc.).

Los pasos a seguir para implementar la primera ECA por los facilitadores, son los siguientes:

- Convocatoria: Utilizando los medios de comunicación (emisoras, citaciones y visitas personales), el apoyo de las asociaciones serán determinantes.
- Desarrollo de la sesión: Se ejecutará el siguiente procedimiento:
 - Bienvenida y presentación
 - Introducción inicial
 - Elección del nombre de la ECA
 - Elección del local de reunión
 - Elección de la parcela de aprendizaje
 - Organización del programa de sesiones
 - Elaboración del Reglamento Interno de la ECA
 - Firma de Actas de Compromiso

En cada sesión de capacitación de una ECA se desarrollarán las capacidades colectivas para la toma de decisiones mediante ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el trabajo en equipo y desarrollar en los productores habilidades para resolver problemas. El facilitador usará una metodología participativa que, a la vez de ser divertida, ofrece la oportunidad de trabajar en conjunto buscando alternativas prácticas para superar las dificultades que afrontan los agricultores en sus plantaciones.

El número de ECA's por cada cultivo a implementarse varía según el cultivo (1 ECA en palmito y 2 ECA's en piña, cada uno con 20 a 25 productores participantes) esta cifra puede ser modificada al momento de su ejecución y depende principalmente del grado de dispersión de las parcelas de los productores, los



agricultores que lo conformarán, por ello la ubicación de la ECA se hará en forma participativa considerando la equidistancia que tienen la ubicación de las parcelas y las cercanías entre las localidades en que viven los productores que van a participar en el presente Plan. En cada ECA se implementarán 2 parcelas de aprendizaje (una para la primera sesión del mes y la otra para la siguiente sesión del mismo mes), en las cuales se realizarán las sesiones que se programarán y a partir del cual se replicará en las fincas de los productores.

NUMERO DE SESIONES DE ECAS PALMITO - PIÑA

ECA's	MENSUAL				TOTAL MES	POR 6 MESES
	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4		
Palmito	sesión 20 productores		sesión 20 productores		2 sesiones	12 sesiones
Piña	sesión 20 productores	sesión 20 productores	sesión 20 productores	sesión 20 productores	4 sesiones	24 sesiones
TOTAL						36 SESIONES

Se intervendrá con los 3 facilitadores/extensionistas contratados quienes capacitarán mediante la Metodología de Escuelas de Campo (ECA's) a **60 a 70 Productores de Palmito y de Piña** de las diferentes localidades del ámbito de acción de la Actividad, básicamente en buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y enfermedades, mejoramiento de suelos, manejo post cosecha, valor agregado, asociatividad, etc. de acuerdo al temario que definan al inicio de la Actividad.

Se realizarán **2 sesiones por mes en cada ECA**, el primero en una parcela de aprendizaje y el segundo en la otra parcela de aprendizaje (por eso se consideran 2 parcelas de aprendizaje por ECA). Ello implica que cada facilitador de cada uno de los cultivos, cada mes realizará 2 sesiones en cada ECA y en todos ellos con el apoyo de los técnicos de campo, así como el acompañamiento del Coordinador de la Actividad. Todo el proceso de ejecución de las sesiones de ECA's se realizará en 6 meses.

Las fechas y horas de las sesiones serán definidas en forma participativa con los integrantes de las ECA's y estas se desarrollarán en los lugares identificados y acordados con los mismos productores.



Durante sesiones de las ECAs, se aplicarán los principios básicos, como son:

- Valorar la experiencia y el conocimiento de los agricultores durante las sesiones de trabajo.
- Las plantaciones son el espacio físico para el desarrollo de cada evento.
- La toma de decisiones debe ser participativo y es responsabilidad de los participantes.
- Los temas de las sesiones se planifican en función al contexto y necesidades de los agricultores.
- Las sesiones se planifican en base a las etapas fenológicas del cultivo.
- El manejo de plagas y enfermedades debe estar acompañado de un entendimiento de los sistemas agro ecológicos.
- La estrategia de trabajo se basa en el Manejo Integrado del Cultivo.
- Se fomenta el respeto étnico y la equidad social y de género.
- El Facilitador es capacitado para transferir conocimientos y desarrollar capacidades en los productores.

En la siguiente reunión de cada sesión, se entregará una hoja resumen de los temas tratados en las sesiones de las ECA's, para que los participantes implementen su archivo informativo de aprendizaje de los temas técnicos tratados en las sesiones de ECA's, las fichas técnicas que se hará entrega son de los 12 temas de las sesiones por 60 productores (20 productores de palmito y 40 productores de piña); es decir, que se entregarán un total de 720 fichas resumen de aprendizaje.

Las ECAs de productores de Pijuayo para Palmito son:

ECA I: Nuevo Jordán, San Antonio y Shambillo.

Las ECAs de productores de Piña son:

ECA I: La Punta, Huacamayo, Huacamaillo.

ECA II: Porvenir, Cerro Colorado, Nuevo Jordán, Llanta Blanca.

En conclusión, se desarrollaran 12 sesiones por facilitador, con 3 facilitadores se realizará un total de 36 sesiones de ECA's.

Unidad de medida: Informes / ECA's

Meta: 36



4.4.2 Ferias Nacionales

Se participará en 3 ferias: 1 regional como la Expo Amazónica 2015, 1 en la Expo Alimentaria 2015 y 1 en Mistura 2015, que se desarrollarán en la región amazónica y en Lima, respectivamente. Para las asociaciones de palmito y piña, participar en estos eventos está resultando muy importante, debido a que representan ventanas para poder negociar no solo la producción que tienen, sino también logran mejores precios de venta.

En los eventos participarán los productores organizados de palmito y piña, presentando los productos promovidos por la Actividad como son las conservas de palmito, frutas frescas de piña, piña en almíbar, mermelada de piña y otros.

Unidad de medida: Informe / Ferias

Meta: 03

4.4.3 Asistencia Técnica (Visitas de Campo)

El método de **asistencia técnica** con eje en las Escuelas de Campo que proponemos, tiene como principio la realización de visitas personalizadas y frecuentes de las plantaciones de los productores de palmito y piña, se realizarán visitas periódicas para asesorar y brindar información tecnológica a los productores, a diferencia de la asistencia técnica tradicional será un proceso activo de INTERAPRENDIZAJE entre los facilitadores rurales (extensionistas) y los promotores rurales (agricultores). El inter aprendizaje implica que los facilitadores rurales deberán ir al campo abiertos a las posibilidades de aprender de las experiencias de los productores, para que a partir de allí, plantear innovaciones, necesarias para mejorar el manejo agronómico, articularlos al mercado y al sistema financiero.

La relación de beneficiarios de palmito y piña, y la ubicación de sus parcelas dentro de las localidades del ámbito de la Actividad, facilita planificar la intervención del sistema de asistencia técnica que permita que todos los productores tengan un adecuado y oportuno asesoramiento y seguimiento técnico por parte del equipo de extensionistas de la Actividad.



La asistencia técnica se realizará de la siguiente manera:

En pijuayo para palmito: el extensionista realizará 4 visitas/día y el técnico 3 visitas/día (haciendo un total de 7 visitas/día), 4 días/semana, 4 semanas/mes y por 10 meses hacen un total de 1,120 visitas.

En piña: los extensionistas realizarán 4 visitas/día y los técnicos 3 visitas/día (haciendo un total de 14 visitas/día), 4 días/semana, 4 semanas/mes y por 10 meses hacen un total de 2,240 visitas.

La propuesta garantiza que cada productor participante será visitado por lo menos 2 veces por mes para recibir asistencia técnica.

VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PALMITO - PIÑA

Cultivos	Visitas por día		días por semana	semanas por mes	TOTAL MES	TOTAL 10 MESES
	Extensionista	Técnico				
Palmito	4	3	4	4	112	1120
Piña	8	6	4	4	224	2240
TOTAL					336	3360

Durante las visitas de asistencia técnica los extensionistas y técnicos realizarán las observaciones del estado situacional del cultivo y dar las recomendaciones técnicas para resolver si existen problemas demostrando a los productores como se realizan las labores culturales en forma práctica e intercambiaran experiencia en cada tema de manejo del cultivo.

En el cultivo de palmito además de realizar la asesoría en el manejo cultural, se apoyará en cosecha, post cosecha, acopio, transformación y comercialización, planificando, coordinando y ejecutando el Plan de Acopio, procesamiento y comercialización de las conservas de palmito. Mientras que en el cultivo de piña, se apoyará la producción comercial de piña en almíbar y mermelada de piña, existiendo la posibilidad de procesar pulpa de piña y piña deshidratada. Este apoyo se realizará con el especialista en valor agregado, quien durante el procesamiento identificará la calidad de las cosechas y los rendimientos de las mismas, cuya información permitirá a los productores mejorar la atención a sus parcelas. El especialista en valor agregado presentará información mensual sobre las cosechas, calidad, rendimiento, procesamiento y comercialización de palmito y piña.



Cada extensionista contará con fichas de recomendaciones técnicas, que en el momento de realizar las visitas de asistencia técnica a los agricultores (personas capacitadas) se le entregará una ficha indicando las recomendaciones técnicas que deben aplicar en sus plantaciones, esto permite hacer el seguimiento sustentado sobre el cumplimiento de las actividades programadas.

Unidad de medida: Informe / Fichas

Meta: 3,360

4.4.4 Plan de Negocios

Durante el año 2014 se hizo 2 planes de negocios para PROCOMPITE que durante el presente año se gestionará su implementación; continuando con el plan de fortalecimiento organizacional durante el presente año se contratará los servicios de consultores para la elaboración de 2 Planes de Negocios para presentar al Programa AGROIDEAS. Un plan de negocios para la Asociación de Productores de Palmito de Aguaytía (ASPPA) y un plan para la Asociación de Productores Piñeros Industriales de la Provincia de Padre Abad (APIPPA). Incluye la realización de los talleres participativos, elaboración de los expedientes y los documentos necesarios.

PLANES DE NEGOCIOS	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Talleres participativos	1		1		
Expedientes, documentos		1		1	
Planes de Negocios			1		1


Unidad de medida: Informe / Plan

Meta: 02

4.4.5 Fortalecimiento Organizacional

En esta etapa de la Actividad, se considera necesario fortalecer a las asociaciones de palmito y piña, mediante la elaboración de Planes Estratégicos incluyendo la implementación de las recomendaciones de urgencia.

Dentro de la elaboración del Plan Estratégico hay que considerar el fortalecimiento de la generación de valor agregado, mediante la implementación de PHS, BPM y registros de marca para el caso de la asociación ASPPA; proponer la implementación de plan de cosecha y post cosecha de piña para la asociación APIPPA.



Consideramos la propuesta importante, debido a que estos productos están en etapa de desarrollo de valor agregado y gestión comercial. Se realizará contratando consultores para la elaboración del Plan Estratégico y su implementación.

Unidad de medida: Informe / Plan

Meta: 02

4.4.6 Reuniones de comercialización.

Se tiene buena experiencia en esta actividad, porque permite mejorar la comercialización y consiste en participar en reuniones con clientes actuales y potenciales tanto para productos en fresco y procesados. Las reuniones generalmente serán en Lima y participarán los representantes de las asociaciones con un personal técnico de la Actividad. El propósito es mejorar la capacidad de negociación de los productores para obtener mejores precios, rapidez de pagos, etc. Las 3 reuniones se justificarán con Actas de las reuniones en donde se especificaran los acuerdos de intensión de compra, ventas, precios, etc.

Unidad de medida: Informe / Acta de Reuniones

Meta: 03

4.5. Graduación.

Consiste en evaluar o medir la adopción de las tecnologías desarrolladas durante la ejecución de la Actividad y para ello tenemos:

4.5.1 Prueba de Caja

Se realizará las pruebas de cajas, a todos los agricultores (personas capacitadas) de las ECA's para determinar el nivel logrado del aprendizaje. Al inicio de la primera sesión y al término de la última sesión de ECA's.

Unidad de medida: Informe / Pruebas

Meta: 60



4.5.2 Entrega de Certificados (Participantes)

En la clausura, se les otorgará un certificado de reconocimiento a los agricultores (personas capacitadas) participantes de la ECA's, que aprobaron la capacitación recibida en las ECA's, los criterios se basan en la asistencia a las sesiones (70%), prueba inicial (10%) y prueba final (20%). El certificado acreditará al productor que ha cumplido los requisitos definidos al inicio del ciclo y será certificado como "Agricultor Experimentador o Innovador".

Unidad de medida: Informe / Certificados

Meta: 60

4.6. Supervisión.

4.6.1 Informes de Supervisión

Para la adecuada marcha de las actividades programadas, se realizarán acciones de seguimiento y monitoreo, por parte de la Municipalidad de Padre Abad como unidad ejecutora y adicionalmente por representantes de DEVIDA. El monitoreo será continuo y sistemático, mediante el cual se verificará la eficiencia y eficacia de los avances de actividades identificando sus logros y debilidades y en consecuencia recomendar medidas correctivas y ajustes a tiempo para optimizar los resultados del plan.

Unidad de medida: Informe / Supervisión

Meta: 09

4.6.2 Reuniones Descentralizadas del Equipo Técnico

Se realizarán reuniones técnicas mensuales descentralizadas con todo el equipo técnico; en dichas reuniones se reportarán los avances realizados, las satisfacciones y dificultades encontradas; para analizar los "cuellos de botella" y en conjunto con todo el equipo técnico plantear y ejecutar acciones para avanzar satisfactoriamente el cumplimiento de los objetivos y metas de la Actividad. Estas reuniones coincidirán con el trabajo de gabinete que previamente deben realizar para los informes mensuales.

Unidad de medida: Informe / Reuniones

Meta: 18



4.7. Elaboración de Material Didáctico.

Consiste en elaborar, diseñar e imprimir materiales didácticos para mejorar el conocimiento de los productores, mediante el contrato por servicio de terceros.

4.7.1 Diseño y Elaboración de Boletines Técnicos

Con la finalidad de que los productores cuenten con documentos impresos sobre la tecnología de los cultivos promovidos y puedan corroborar las enseñanzas que se desarrollan en las escuelas de campo y las capacitaciones programadas, se diseñará y elaborará boletines técnicos con temas propuestos por los mismos productores participantes. Se tendrá en cuenta que anteriormente ya se ha distribuido boletines técnicos y es por ello que en esta oportunidad se diseñarán e imprimirán boletines con temas nuevos como: Cuidado del Medio Ambiente y Buenas Prácticas Agrícolas.

El boletín técnico debe conceptualizar adecuadamente el significado y la filosofía de extensión agrícola y las estrategias para poder comunicarse y transferir o retroalimentar experiencias con los productores. La edición e impresión de los boletines se realizará por servicios de terceros. Se imprimirá 1 millar para palmito y 1 millar para piña.

Unidad de medida: Informe / Boletines

Meta: 02 (1 para palmito y 1 para piña)

4.7.2 Diseño y Elaboración de Trípticos

El equipo técnico elaborará trípticos sobre toda la temática que comprende temas de interés para los productores como: asociatividad, gestión empresarial, manejo de residuos sólidos, entre otros; con la finalidad de entregar a los participantes en las Escuelas de Campo. Se elaborará 3 millares de trípticos de palmito y 3 millares de trípticos de piña.

Además se elaborará 2 millares de brochures y fichas técnicas a favor de las organizaciones de productores para que difundan los productos que se vienen promoviendo, se diseñaran en español y en inglés.

Unidad de medida: Informe / Trípticos

Meta: 10



5. FASE: COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD:

Esta actividad comprende los siguientes pasos:

5.1. Difusión mediante Publicidad y Notas de Prensa.

Se identificará a través de los productores participantes y moradores del ámbito de intervención de la Actividad, los principales medios de comunicación radial locales y regionales, en donde se difundirán los avances, resultados y labores que se realizan para tener informado a la población y mantener una relación de comunicación constante con los productores.

El coordinador en conjunto con los facilitadores de la Actividad deberán formular y publicar notas de prensa en las emisoras locales y diarios o páginas web, informando sobre la ejecución de las ECA's, pasantías, ferias, capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria que se viene ejecutando.

El uso de las redes sociales y la publicación en las páginas web, actualmente son necesarios, para que se difunda en gran escala los productos que se vienen promoviendo, incluyendo los volúmenes de producción, calidad y precios de venta. Este medio de difusión se intensificará el presente año utilizando la página web de la Municipalidad.

Unidad de medida: Informe / Notas


Meta: 5

5.2. Banners.

Se elaborará banners para: 2 carteles de la Actividad, 4 banners para participar en ferias, 4 banners para las ECA's y como muestra 4 banners para las parcelas demostrativas más cercanas a la vía principal.

Unidad de medida: Informe / Banners

Meta: 14



"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL C.P. HUIPOCA Y ALEDAÑOS - 2015"

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD


PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE (DAIS)

PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y PIÑA) EN EL CENTRO POBLADO DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI"
CODIGO PRESUP.:

Código (1)	ACTIVIDAD / TAREAS (2)	Unidad de Medida (3)	META MENSUAL (4)												Meta Anual (5)	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	FAMILIAS ASISTIDAS	FAMILIAS														
1	SELECCIÓN DE EQUIPO TÉCNICO															
1.1	Selección del Equipo Técnico de la Actividad	Informe			1										1	
2	FORMACIÓN DE FACILITADORES															
2.1	Selección de Institución Capacitadora en metodología CEFE	Informe				1									1	
2.2	Capacitación de Extensionistas	Informe					1		1						2	
3	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN															
3.1	Identificación de la Comunidad y Participantes	Informe			1										1	
3.2	Inducción y Socialización de la Actividad	Informe/Actas			2	2									4	
3.3	Implementación y Definición de Cumcula	Informe				1									1	
4	EJECUCIÓN															
4.1	Sinceramiento del grupo (participantes)	Informe					1								1	
4.2	Determinación del Contenido de las Sesiones de ECA's	Informe					1								1	
4.3	Parcelas de Aprendizaje															
4.3.1	Parcelas de Aprendizaje de Pijuyo para Palmito	Informe/Parcelas							4	4	2		4	4	2	2D
4.3.2	Parcelas de Aprendizaje de Piña var. Golden	Informe/Parcelas							3	3	3	3	3	3	2	20
4.4	Desarrollo de las Sesiones de ECA															
4.4.1	Desarrollo de las Escuelas de Campo	Informe/ECA's					6	6	6	6	6	6	6			36
4.4.2	Ferias Nacionales	Informe/Ferias						1			1	1				3
4.4.3	Asistencia Técnica (Visitas de Campos)	Informe/Fichas			336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	3360
4.4.4	Plan de Negocios	Informe/PN							1	1		1				2
4.4.5	Fortalecimiento Organizacional	Informe/Plan							1		1					2
4.4.6	Reuniones de comercialización	Informe/Acta de Reuniones							1		1				1	3
4.5	Graduación.															
4.5.1	Prueba de Caja	Informe/Pruebas													60	60
4.5.2	Entrega de Certificados	Informe/Certificados													60	60
4.6	Supervisión															
4.6.1	Informes de Supervisión	Informe/Supervisión				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4.6.2	Reuniones descentralizadas del equipo técnico	Informe/Reuniones			1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	18
4.7	Elaboración de Material Didáctico															
4.7.1	Diseño y Elaboración de Boletines Técnicos	Informe/Boletines								1	1					2
4.7.2	Diseño y Elaboración de Trípticos	Informe/Trípticos							4	3	3					1D
	COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD															
5.1	Difusión mediante Publicidad y Notas de Prensa	Informe/Notas				1		1		1			1		1	5
5.2	Banners	Informe/Baners				6			8							14



"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL C.P.M. DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS - 2015"

FORMATO N° 03

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE (DAIS)

PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y PIÑA) EN EL CENTRO POBLADO DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI" CODIGO PRESUP.:

GENERIC A DE GASTO (1)	ESPECIFICAS DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4) SI.
	CODIGO (5)	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3	2.3	Bienes y Servicios													
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17400.00
	2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.00
	2.3.15.12	PÁPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	1500.00	4500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
	2.3.10.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	21680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	227680.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	40800.00
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1500.00
	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	5000.00
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	10000.00
	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	18200.00
	2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	4050.00	7340.00	22600.00	46680.00	18080.00	32280.00	16780.00	21880.00	7400.00	600.00	177690.00
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	0.00	0.00	27300.00	27300.00	27300.00	27300.00	30000.00	27300.00	27300.00	27300.00	27300.00	30000.00	278400.00
	2.3.2.8.1.2	ES SALUD CAS	0.00	0.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	9450.00
2.6	2.6	Adquisición de activos no financieros													
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
		TOTAL	0.00	0.00	52345.00	65715.00	291475.00	78875.00	53475.00	65975.00	47975.00	70075.00	38595.00	35495.00	800000.00



060022
